



MANUAL

de Usuario Sistema Integrado de
Planificación e Inversión Pública -SIPeIP

Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional
Gasto No Permanente

Marzo 2024



EL NUEVO
ECUADOR 

Secretaría Nacional
de Planificación

Tabla de Contenido

1.	Introducción.....	2
2.	Objetivo del Manual.....	2
3.	Alcance del Módulo.....	2
4.	Requerimientos Técnicos.....	3
5.	Acceso al Módulo.....	3
6.	Menú principal del módulo de seguimiento a la planificación institucional.....	4
7.	Fase de Programación.....	7
7.1.	Sección: Datos Generales.....	7
7.2.	Sección: Presupuesto e-SIGEF.....	8
7.3.	Sección: Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025.....	8
7.4.	Sección: Ejecución Histórica.....	9
7.5.	Sección: Programación Proyecto.....	9
7.5.1.	Programación Trimestral: Pantalla Detalle de Componentes.....	10
7.5.2.	Sección Ejecución Proyecto.....	13
8.	Fase de Seguimiento Trimestral.....	15
8.1.	Sección Seguimiento Año 2023 (Avance Físico).....	15
9.	Reportes.....	20
9.1	Reporte por proyecto.....	20
9.2	Reporte consolidado.....	21

1. Introducción

La Secretaría Nacional de Planificación coordina y articula la planificación a mediano y largo plazo, orientada al desarrollo sostenible e incluyente del país, considerando mejoras a la calidad de vida de la población.

Dentro del ciclo de la Planificación Nacional, el Subsistema de Seguimiento y Evaluación tiene el propósito de monitorear y evaluar las políticas públicas en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

Las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado, en el ámbito de sus competencias, identifican y establecen la programación de su planificación institucional a corto y mediano plazo, lo cual orienta la toma de decisiones y el curso de acción encaminado a la generación y provisión de productos (bienes y /o servicios) que benefician a la ciudadanía. Al formular la planificación, las entidades identifican las metas que esperan alcanzar y que contribuyen a cumplir con los objetivos de la Planificación Estratégica, Planes Sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo.

El Plan Anual de Inversiones – PAI, es el instrumento de programación anual que contiene la descripción presupuestaria de los estudios, programas y proyectos de inversión pública prioritarios para la asignación de recursos, correspondiente a las entidades, instituciones y organismos del sector público que reciben o recibirán financiamiento a través del Presupuesto General del Estado.

2. Objetivo del Manual

Brindar a las instituciones del sector público (exceptuando Gobiernos Autónomos Descentralizados) una guía sobre el uso de la herramienta del Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), para el ingreso de información de estudios, programas y proyectos de inversión que se financian con recursos del Gasto No Permanente del Presupuesto General del Estado.

3. Alcance del Módulo

Recopilar información de programación y ejecución de avance físico de los estudios, programas y proyectos de inversión pública de las entidades del sector público que conforman el Plan Anual de Inversiones.

4. Requerimientos Técnicos

Para el ingreso a los enlaces web de la Secretaría Nacional de Planificación, es necesario los navegadores:

Mozilla Firefox
(Versión 91.8)




Internet Explorer
(Versión 11)



5. Acceso al Módulo

Para el funcionamiento eficiente del Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional – Gasto No Permanente, se debe utilizar únicamente los navegadores Internet Explorer (Versión 11) y Mozilla Firefox (Versión 91.8.0) los cuales se los puede descargar gratuitamente desde Internet.

El ingreso al Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, se lo realiza a través de la página web de la Secretaría Nacional de Planificación (www.planificacion.gob.ec), sección **Servicios**, elegimos la opción **Programa / Servicios**, seleccionamos **Sistemas** y, a continuación el recuadro **Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública**.

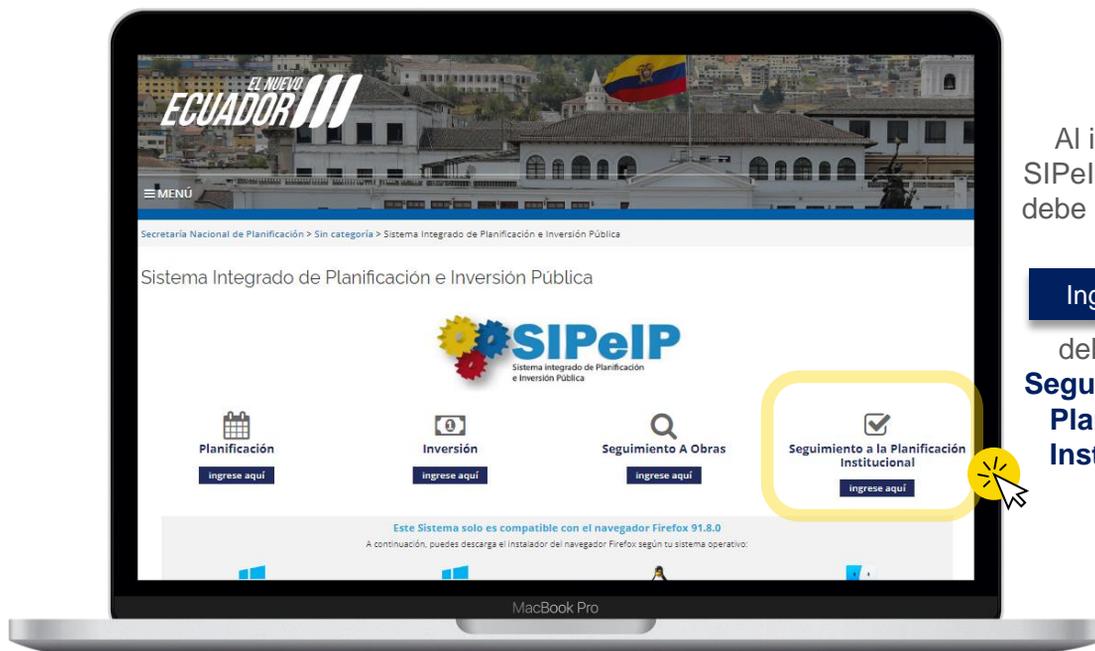

Al ingresar al SIPeIP, el usuario debe dar clic en el botón:

Ingrese aquí

del apartado **Seguimiento a la Planificación Institucional**.


Descarga y revisa el manual de instalación de los navegadores que soportan el SIPeIP

Descarga aquí

Ingresa directamente al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP

Ingresa aquí

El sistema presenta la pantalla Sistema de Autenticación CAS.

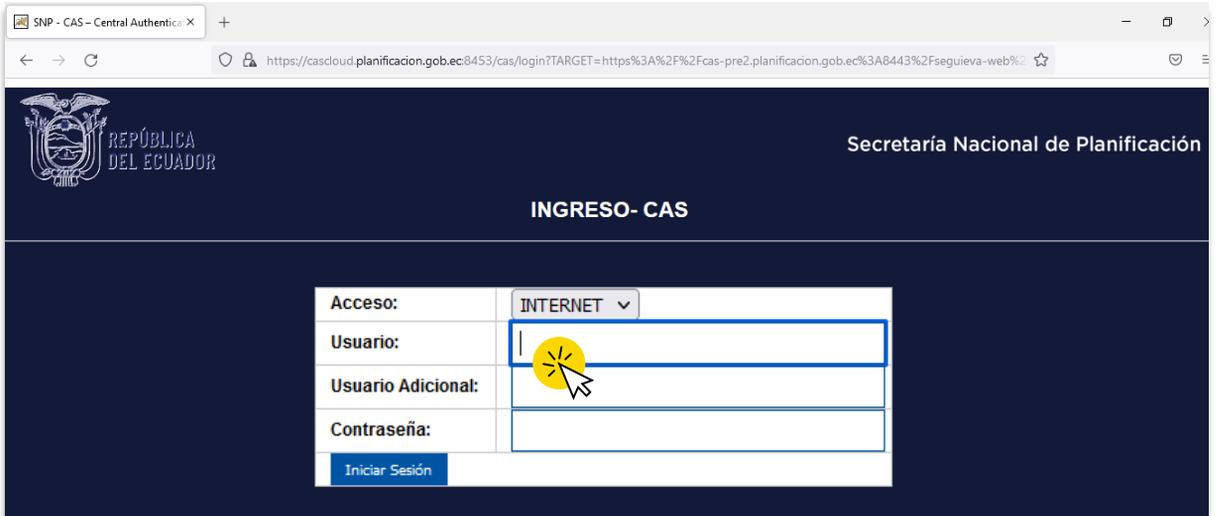

Para acceder al sistema, el usuario deberá contar previamente con una clave de acceso, que asigna la Secretaría Nacional de Planificación en base a la solicitud de las entidades para que administren los Módulos del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública.

Para lo cual, la institución deberá considerar el Procedimiento para solicitud de usuarios y acceso al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública SIPeIP o solicitar apoyo a mesa de ayuda al correo ayuda@planificacion.gob.ec.

En esta primera pantalla se presentan los siguientes campos a ser llenados por el usuario:



Acceso: En este campo debe seleccionarse la opción INTERNET.

Usuario: En este campo debe registrarse el RUC de la entidad.

Usuario Adicional: En este campo debe registrarse el número de cédula de la persona que tiene la clave, de acuerdo con el perfil seleccionado.

Contraseña: En este campo se debe ingresar la clave de seguridad personal.

6. Menú principal del módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional

Una vez ingresado al **Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional**, el usuario debe dar clic en la pestaña de “**SEGUIMIENTO_EVALUACIÓN**”.



El usuario debe escoger “**SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**”




El sistema presentará el siguiente submenú: ”




El usuario debe dar clic en la opción “**GASTO NO PERMANENTE**”

El usuario debe dar clic en la opción “**GASTO NO PERMANENTE**” y seleccionar la opción “**PROGRAMACIÓN Y AVANCES DE PROYECTOS**”.

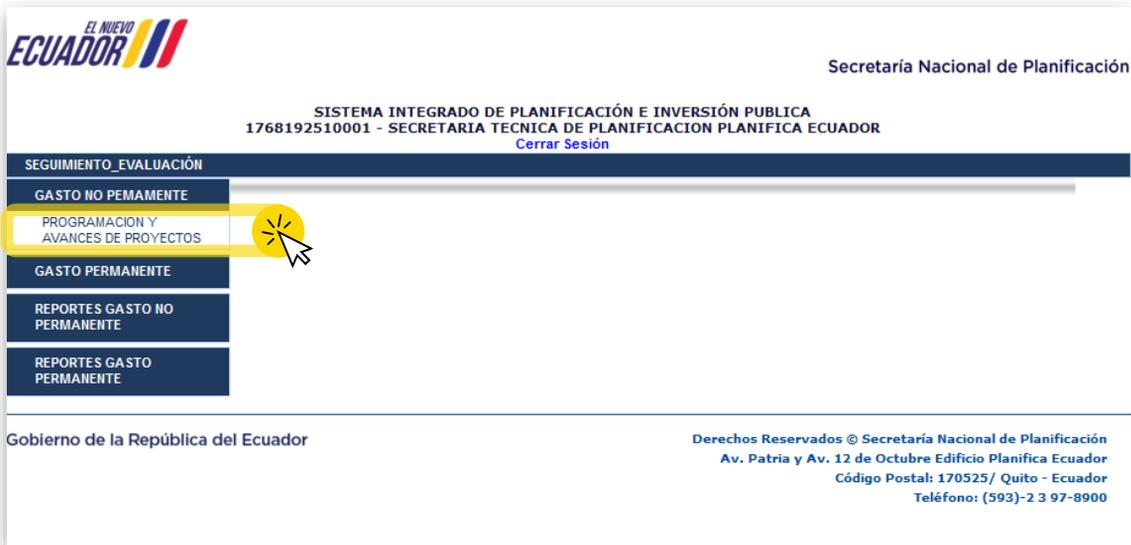

El sistema habilita la pantalla “**PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS**” y presenta el listado de proyectos de la entidad sujetos al seguimiento.

El usuario puede realizar la búsqueda de los proyectos por el “CUP” o por el “Nombre de Proyecto” y posteriormente dar clic en buscar; o directamente seleccionarlo del listado de proyectos disponibles.

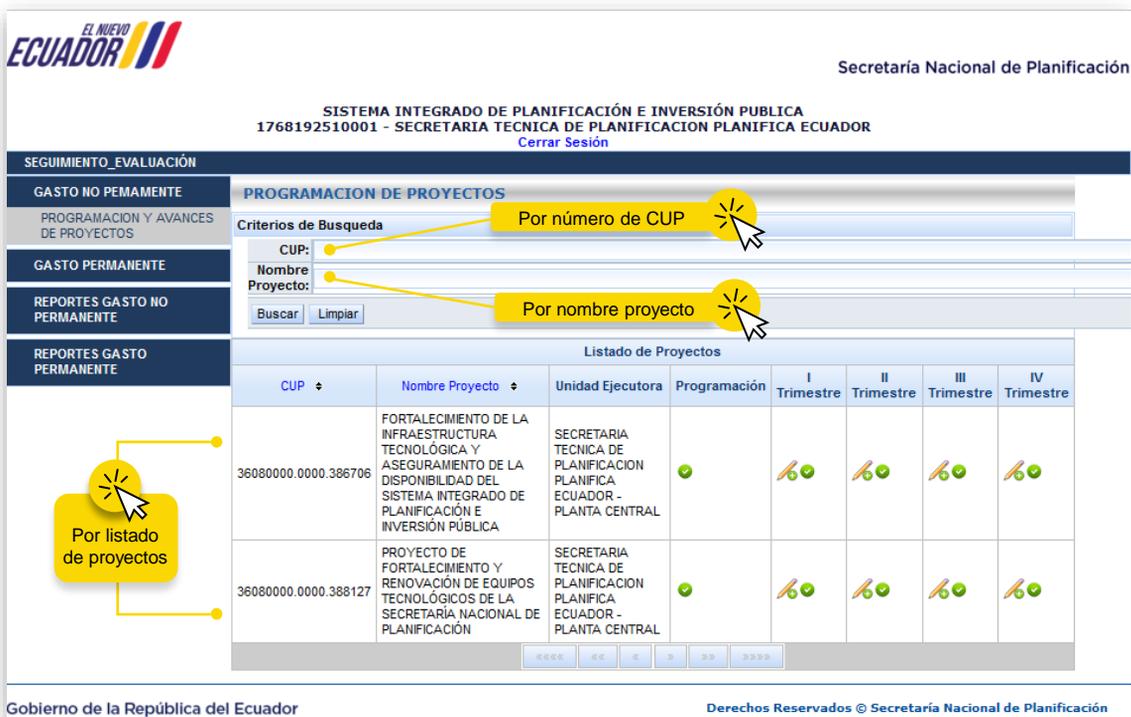

Para ingresar a un proyecto y actualizar la información (programación o seguimiento de proyecto, según corresponda el trimestre), el usuario debe dar clic en el icono “**Editar**” 

El sistema muestra la pantalla “**PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS**” con la información principal del proyecto seleccionado.

PROGRAMACION DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto SISTEMA ECUATORIANO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
CUP 091590000.0000.387067	Fecha Inicio 2022-01-01	Fecha Fin 2025-12-31	Monto Total 5,755,201.75

PRESUPUESTO E-SIGEF

Codificado USD 2024	Devengado USD Trimestre 1	Devengado USD Trimestre 2 2024	Devengado USD Trimestre 3 2024	Devengado USD Trimestre 4 2024
805,409.69	733,384.22	0.00	0.00	0.00

PLAN DE DESARROLLO PARA EL NUEVO ECUADOR 2024 - 2025

OBJETIVO PND 2024-2025:	2 Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios
POLITICA:	2.2 Promover una educación de calidad con un enfoque innovador, competencial, inclusivo, resiliente y participativo
META:	2.2.1 Incrementar el porcentaje de víctimas de violencia sexual detectadas o cometidas en el ámbito educativo y que r

EJECUCION HISTORICA

Avance Acumulado año Anterior 58.87 %

Avance Acumulado Real (Año anterior) % *

Archivo de justificación

[Adjuntar archivo](#)

PROGRAMACION PROYECTO

Programación anual 2024  **Metas Físicas 24.07 % ***

Metas Presupuestaria 100.00 %

Programación Primer Trimestre	Programación Segundo Trimestre	Programación Tercero Trimestre	Programación Cuarto Trimestre
METAS FISICAS			
<input type="text" value="5.01"/> % *	<input type="text" value="5.01"/> %	<input type="text" value="5.12"/> %	<input type="text" value="8.93"/> %
METAS PRESUPUESTARIAS			
<input type="text" value="25.00"/> % *	<input type="text" value="25.00"/> %	<input type="text" value="25.00"/> %	<input type="text" value="25.00"/> %

EJECUCION PROYECTO

Ejecución Primer Trimestre	Ejecución Segundo Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Ejecución Cuarto Trimestre
AVANCE FISICO			
<input type="text" value="0.25"/> % *	<input type="text" value="0.00"/> %	<input type="text" value="0.00"/> %	<input type="text" value="0.00"/> %
AVANCE PRESUPUESTARIO			
<input type="text" value="91.06"/> % *	<input type="text" value="0.00"/> %	<input type="text" value="0.00"/> %	<input type="text" value="0.00"/> %

Avance 2024 0.25 %

Avance Total Acumulado 59.12 %

Estado

LOGROS Y NUDOS CRITICOS

7. Fase de Programación

La pantalla “**PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS**” cuenta con las siguientes Secciones:

7.1. Sección: Datos Generales

El sistema presenta la siguiente información predefinida:

Nombre del Proyecto: Muestra el nombre del proyecto con el cual fue ingresado en el módulo de inversión del SIPeIP.

Código Único del proyecto (CUP): Es el número identificador del proyecto que se genera al ingresar el mismo por primera vez en el módulo de inversión del SIPeIP.

Fecha inicio: Corresponde a la fecha de inicio estimada de ejecución del proyecto registrada en el módulo de inversión del SIPeIP.

Fecha Fin: Corresponde a la fecha de fin estimada de la ejecución del proyecto registrada en el módulo de inversión del SIPeIP.

Monto Total: Corresponde al valor total del proyecto registrado en el módulo de inversión de SIPeIP, el mismo que debe ser consistente con el documento del proyecto priorizado. .

DATOS GENERALES			
Nombre del Proyecto	AMPLIACION DEL EDIFICIO MATRIZ - EDIFICIO DE PARQUEADEROS Y OFICINAS		
CUP	Fecha Inicio	Fecha Fin	Monto Total
195910000.0000.375508	2013-06-11	2023-06-30	21,533,521.81

7.2. Sección: Presupuesto e-SIGEF

El sistema presenta la información presupuestaria (codificado y devengado) de acuerdo con los registros del sistema e-SIGEF del respectivo período:

PRESUPUESTO E-SIGEF				
Codificado USD 2023	Devengado USD Trimestre 1	Devengado USD Trimestre 2 2023	Devengado USD Trimestre 3 2023	Devengado USD Trimestre 4 2023
331,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00

7.3. Sección: Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador

El Plan Nacional de Desarrollo es el máximo instrumento de planificación nacional, en el que se establece la directriz política y administrativa para diseñar e implementar la política pública en Ecuador. Está compuesto por 4 ejes:



El sistema presenta la siguiente información en pantalla para selección del usuario:

Objetivo PND 2024 – 2025: Corresponde al listado de los 9 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025, que están precargados, al cual el proyecto de inversión se debe alinear.

Política: Corresponde al listado políticas nacionales asociadas a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, que están precargados, al cual el proyecto de inversión se debe alinear.

Meta: Corresponde al listado de metas nacionales asociadas a las políticas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, que están precargados, al cual el proyecto de inversión se debe alinear.



El usuario debe seleccionar un objetivo, una política y una meta del PND, considerando la alineación establecida en el documento del proyecto priorizado.

7.4. Sección: Ejecución Histórica

En esta sección el sistema presenta:

Avance acumulado al año anterior: La entidad visualizará el histórico del porcentaje de avance del proyecto registrado el año anterior, al periodo de reporte.

Avance acumulado real¹: Permite modificar el avance acumulado del año anterior en caso de ser necesario y se deberá adjuntar el informe justificativo respectivo.

Archivo de justificación: Este campo permite a la entidad adjuntar un archivo que justifique el cambio de avance acumulado real.

Adjuntar archivo: Permite adjuntar un archivo en formato PDF cuando el usuario modifica el campo Avance acumulado Real.



EJECUCION HISTORICA	
Avance Acumulado año Anterior	100.00 %
Avance Acumulado Real (Año anterior)	100.0 % *

Archivo de justificación

Adjuntar archivo 

7.5. Sección: Programación Proyecto

En esta sección el sistema presenta:

Programación 2024: Corresponde al total la programación anual porcentual del año.

Programación Trimestres: El sistema presenta los campos referentes a la programación que debe registrar el usuario correspondiente a cada trimestre.

(1) Avance Acumulado Real: En el caso de ser diferente, el valor del "Avance Acumulado Real" puede ser ajustado por la entidad, para lo cual se debe sustentar con un archivo de respaldo justificativo (en formato PDF con un peso máximo de 4 megas) que señala las razones de la modificación del avance histórico. Esta acción únicamente puede ser realizada en la fase de programación. Si no se registra en el sistema el archivo de respaldo, el sistema emitirá un mensaje de alerta al guardar la información. Los documentos de sustento del cambio del avance acumulado real deben ser validados y suscritos por el Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica o quien haga las veces, y por el responsable del Proyecto.

PROGRAMACION PROYECTO

Programación anual 2024  Metas Físicas 24.07 % *
Metas Presupuestaria 100.00 %

Programación Primer Trimestre Programación Segundo Trimestre Programación Tercero Trimestre Programación Cuarto Trimestre

METAS FISICAS

5.01 % * 5.01 % 5.12 % 8.93 %

METAS PRESUPUESTARIAS

25.00 % * 25.00 % 25.00 % 25.00 %

El usuario debe registrar la programación correspondiente al año; para lo cual, debe dar clic en el icono Editar  (Este icono estará visible únicamente para el periodo de apertura del sistema²).

7.5.1. Programación Trimestral: Pantalla Detalle de Componentes

Para los proyectos que se ejecutaron en el PAI 2023 y que continúan su ejecución en el PAI 2024, se visualizará la información precargada de acuerdo a lo registrado por la entidad en el proceso de seguimiento 2023 a través del módulo de seguimiento del SIPeIP.

PROGRAMACION DE PROYECTOS

DETALLE COMPONENTES

CUP: 195910000.0000.387152

Nombre del Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Avance Acumulado Real (Año anterior): 0.00

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	PONDERACION	PROGRAMACION AÑO 2023		SEGUIMIENTO AÑO 2023	
				META ANUAL	PONDERACION	TOTAL SEGUIMIENTO	
C1. OBRA CIVIL, ADECUACIONES Y PERÍMETRO DE SEGURIDAD	ADECUACIÓN CENTRO DE DATOS	0.06	6.00	0.00	0.00	0.00	 ✖
C2. APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	EQUIPAMIENTO INSTALADO PARA MANTENER DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS	0.94	94.00	0.00	0.00	0.00	 ✖
		100.00		0.00	0.00	0.00	

Nuevo Guardar Cancelar

Si la información no es consistente con la matriz de marco lógico del documento de proyecto que cuenta con dictamen de prioridad o actualización de prioridad, la entidad deberá proceder con su respectiva actualización; para lo cual la entidad, podrá editar la información dando clic en el icono editar  ; o a su vez podrá eliminar la información precargada dando clic en el botón eliminar .

En caso de que se requieran agregar nuevos componentes, productos o indicadores, la entidad deberá proceder a registrar la información en conformidad a la matriz del marco lógico del documento de proyecto que cuenta con dictamen de prioridad o actualización de prioridad; para lo cual se debe considerar:

La pantalla “**DETALLE DE COMPONENTES**” presenta de manera predeterminada el CUP, Nombre del Proyecto, Avance Acumulado Real y las siguientes opciones:

Nuevo

Guardar

Cancelar

(2) Se habilita el campo relacionado al seguimiento en función del trimestre que se reporta e inhabilita automáticamente el campo que no corresponde al reporte del seguimiento. Es decir, si corresponde el ingreso al segundo trimestre del año en curso, el módulo automáticamente inhabilita el campo de avance del Primer trimestre.

El usuario debe dar clic en el botón “Nuevo”



Nota: Verificar que la sumatoria de la programación anual más el avance acumulado real no sobrepase el 100%.

A continuación, el sistema despliega la pantalla “**DETALLE DE COMPONENTES**”

El usuario debe ingresar manualmente:

Componentes Marco Lógico³: Se debe registrar y/o verificar que la descripción de todos los componentes del marco lógico sea consistente de acuerdo con el último documento de proyecto priorizado o su actualización. Caso contrario se debe actualizar y/o registrar la descripción de todos los componentes del marco lógico de acuerdo con el último documento de proyecto que cuenta con dictamen de prioridad o actualización de prioridad. Antes de la descripción del componente el usuario debe anteponer el número del componente al que corresponde de acuerdo al documento de proyecto priorizado. (C1, C2, C3... n), por ejemplo:

(3) En caso de que la información registrada en el módulo de seguimiento respecto a: componente, indicador/producto y meta total, no sea consistente con la información del documento priorizado, será sujeto de Observación.

Por ejemplo:

C1. Infraestructura...

C2. Equipamiento...

Producto: En este campo se debe ingresar todos los productos o indicadores de cada componente del proyecto, mismo que debe ser medible (bienes y/o servicios entregados).

Meta Total: Es la cuantificación de lo que se pretende alcanzar al término del proyecto en función de los productos establecidos.

Ponderación: Consiste en la ponderación de los componentes de acuerdo con lo establecido en documento de proyecto priorizado, cuya sumatoria debe ser igual al 100%, caso contrario, el sistema no permite guardar la información y emitirá un mensaje de alerta.

COMPONENTE MARCO LOGICO	C1. Incrementar cobertura a los actores del sistema educativo a través de los cursos de inducción, formación continua y aplicación de acompañamiento garantizando la equidad territorial.
PRODUCTO	33909030.38
META TOTAL	200 <small>Ejemplo: 500.25, máximo 2 decimales.</small>
PONDERACION	50



Nota: La ponderación debe mantenerse durante el tiempo de ejecución del estudio, programa o proyecto de inversión, con el objeto de mantener concordancia en el seguimiento y reporte de avance de resultados.

Posteriormente, en la sección “**Programación Año 2024**” el usuario debe registrar:

Meta anual: Corresponde al número de unidades a ejecutarse durante el periodo fiscal vigente, en relación a la meta total establecida.

Unidades: Corresponde a la meta anual distribuida en unidades para cada trimestre. El sistema de acuerdo con las unidades registradas, presentará la respectiva ponderación.

PROGRAMACION AÑO 2023									
META ANUAL	PONDERACION	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4	
		UNIDADES	PONDERACION	UNIDADES	PONDERACION	UNIDADES	PONDERACION	UNIDADES	PONDERACION
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Una vez registrada toda la información referente a la meta anual y su programación trimestral, el usuario debe dar clic en el botón “**Guardar**”. Y el sistema muestra la siguiente pantalla:

PROGRAMACION DE PROYECTOS

DETALLE COMPONENTES

CUP: 195910000.0000.375508

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DEL EDIFICIO MATRIZ - EDIFICIO DE PARQUEADEROS Y OFICINAS

Avance Acumulado Real (Año anterior): 100.00

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	PONDERACION	PROGRAMACION AÑO 2023		SEGUIMIENTO AÑO 2023
				META ANUAL	PONDERACION	TOTAL SEGUIMIENTO
C1. CONSTRUIR UN EDIFICIO CON SIETE NIVELES DE PARQUEADEROS Y CUATRO NIVELES DE OFICINAS	UN EDIFICIO DE SIETE NIVELES DE PARQUEADEROS Y CUATRO NIVELES DE OFICINAS	10.00	100.00	5.00	50.00	0.00
		100.00		50.00		0.00

Nuevo Guardar Cancelar

Para el registro de uno o más componentes, productos o indicadores, el usuario debe dar clic en la opción **“Nuevo”** y realizar todos los pasos detallados en el apartado 7.5.1. del presente manual.

Una vez registrada la información de todos los componentes y los productos / indicadores, en la pantalla **“DETALLE DE COMPONENTES”**, el usuario visualizará la programación realizada y procede a seleccionar la opción **“Guardar”**.

PROGRAMACION DE PROYECTOS

DETALLE COMPONENTES

CUP: 195910000.0000.375508

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DEL EDIFICIO MATRIZ - EDIFICIO DE PARQUEADEROS Y OFICINAS

Avance Acumulado Real (Año anterior): 100.00

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	PONDERACION	PROGRAMACION AÑO 2023		SEGUIMIENTO AÑO 2023
				META ANUAL	PONDERACION	TOTAL SEGUIMIENTO
C1. CONSTRUIR UN EDIFICIO CON SIETE NIVELES DE PARQUEADEROS Y CUATRO NIVELES DE OFICINAS	UN EDIFICIO DE SIETE NIVELES DE PARQUEADEROS Y CUATRO NIVELES DE OFICINAS	10.00	100.00	5.00	50.00	0.00
		100.00		50.00		0.00

Nuevo **Guardar** Cancelar

El sistema guarda la información y regresa a la pantalla **“PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS”**.

7.5.2. Sección Ejecución Proyecto

Una vez guardada la información, el sistema vuelve a la pantalla principal **“Programación de Proyectos”**, habilitándose la sección **“EJECUCIÓN PROYECTO”**.

EJECUCION PROYECTO			
Ejecución Primer Trimestre	Ejecución Segundo Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Ejecución Cuarto Trimestre
<input type="text" value="0.00"/> % *	<input type="text" value="0.00"/> %	<input type="text" value="0.00"/> %	<input type="text" value="0.00"/> %
Avance 2023	0.00 %		
Avance Total Acumulado	100.00 %		
Estado	EN EJECUCION ▾		

En esta sección el usuario debe registrar el estado del proyecto, para lo cual debe seleccionar uno de los siguientes estados:

En ejecución: Proyecto que avanza conforme lo programado.

No inicia: Proyecto que aún no inicia la etapa de ejecución, debido a factores como contratación del equipo técnico, adquisición de bienes inmuebles, recorte presupuestario, demoras en el proceso de contratación, entre otros.


Paralizado: Proyecto detenido como resultado de la no ejecución de actividades según lo programado.

Finalizado: Proyecto que ha culminado la fase de ejecución de metas.

El usuario debe dar clic en el botón “**Guardar**” para finalizar con el ingreso de la programación.

EJECUCION PROYECTO			
Ejecución Primer Trimestre	Ejecución Segundo Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Ejecución Cuarto Trimestre
AVANCE FISICO			
<input type="text" value="0.25"/> % *	<input type="text" value="0.00"/> %	<input type="text" value="0.00"/> %	<input type="text" value="0.00"/> %
AVANCE PRESUPUESTARIO			
<input type="text" value="91.06"/> % *	<input type="text" value="0.00"/> %	<input type="text" value="0.00"/> %	<input type="text" value="0.00"/> %
Avance 2024	0.25 %		
Avance Total Acumulado	59.12 %		
Estado	EN EJECUCION ▾		
LOGROS Y NUDOS CRÍTICOS			
Primer Trimestre			
<input type="text"/>			
Segundo Trimestre			
<input type="text"/>			
Tercer Trimestre			
<input type="text"/>			
Cuarto Trimestre			
<input type="text"/>			
<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>		

Una vez que se ha registrado toda la información de la programación del proyecto, el sistema devolverá el mensaje: **“Los datos del Proyecto 195910000.0000.375508 se han guardado correctamente”**, caso contrario emitirá la alerta respectiva.

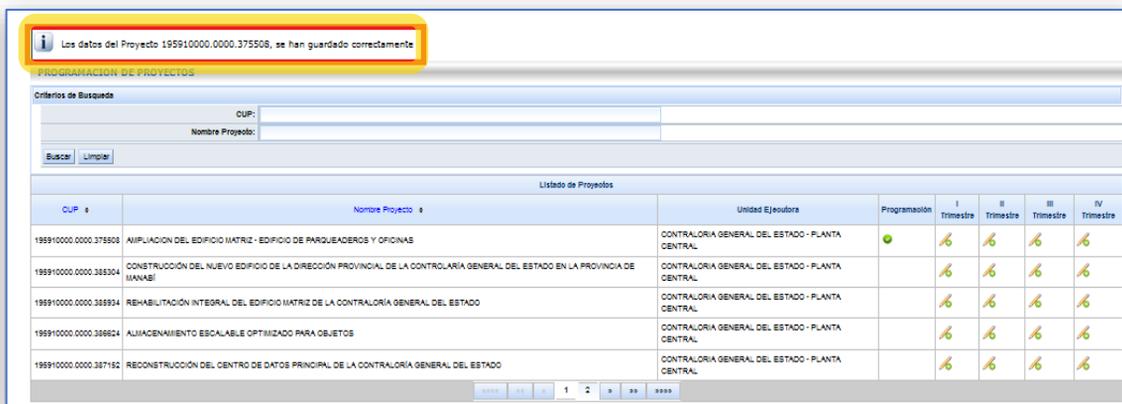

Finalizada la fase de programación el sistema mostrará un visto de color verde  , lo cual indica que se ha concluido con el proceso correctamente..

8. Fase de Seguimiento Trimestral

Corresponde al registro de resultados por cada trimestre respectivamente, teniendo como base la programación realizada. Esta sección estará habilitada únicamente en la temporalidad que la determine el ente rector de la planificación nacional, para lo cual el usuario debe ingresar al sistema, cumpliendo con los pasos establecidos en los numerales 5 y 6 del presente manual.

8.1. Sección Seguimiento Año 2024 (Avance Físico)

El usuario, selecciona el proyecto a registrar la información referente al seguimiento del trimestre correspondiente y da clic en la opción editar .



El sistema presenta la pantalla de **“PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS”**

En la sección **“EJECUCIÓN DEL PROYECTO”**, el usuario debe dar clic en el icono ejecución según el trimestre que corresponde .

El sistema presenta la pantalla de **“PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS”**

En la sección **“Ejecución del Proyecto”**, el usuario debe dar clic en el icono ejecución según el trimestre que corresponde. 

PROGRAMACION DE PROYECTOS				
DATOS GENERALES				
Nombre del Proyecto IMPLEMENTACION DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO EN LA RVE				
CUP 50680000.0000.387096	Fecha Inicio 2022-01-03	Fecha Fin 2025-12-31	Monto Total 40,374,346.12	
PRESUPUESTO E-SIGEF				
Codificado USD 2022	Devengado USD Trimestre 1	Devengado USD Trimestre 2 2022	Devengado USD Trimestre 3 2022	Devengado USD Trimestre 4 2022
17,828,555.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan de Creación de Oportunidades 2021 - 2025				
OBJETIVO PND 2021-2025	Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos			
POLITICA	3.2 Fortalecer la seguridad de los sistemas de transporte terrestre y aéreo, promoviendo ambientes seguros			
META	3.2.1 Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, in situ, de 12.92 a 11.90, por cada 100 000 kg			
Ejecucion Historica				
Avance Acumulado Real	0.0 % *			
Archivo de justificación	<input type="button" value="Adjuntar archivo"/>			
PROGRAMACION PROYECTO				
Programación anual 2024	Metas Físicas 24.07 % *			
	Metas Presupuestarias 100.00 %			
Programación Primer Trimestre	Programación Segundo Trimestre	Programación Tercero Trimestre	Programación Cuarto Trimestre	
METAS FISICAS	5.01 % *	5.01 %	5.12 %	8.93 %
METAS PRESUPUESTARIAS	25.00 % *	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Ejecucion Proyecto				
Ejecución Primer Trimestre	Ejecución Segundo Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Ejecución Cuarto Trimestre	
AVANCE FISICO	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
AVANCE PRESUPUESTARIO	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Avance 2024	0.25 %			
Avance Total Acumulado	59.12 %			
Estado	EN EJECUCION			
Estado	EN EJECUCION			
LOGROS Y RUIDOS CRITICOS				
Primer Trimestre				
Segundo Trimestre				
Tercer Trimestre				
Cuarto Trimestre				
<input type="button" value="Cancelar"/>				

A continuación se mostrará la ventana de **“DETALLE DE COMPONENTES”**

El sistema presenta la pantalla “**DETALLE DE COMPONENTES**”, donde se visualizan los componentes y los productos programados por la entidad.

PROGRAMACION DE PROYECTOS

DETALLE COMPONENTES

CUP: 30680000.0000.387096

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO EN LA RVE

Avance Acumulado Real: 0.00

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	MES TOTAL	PONDERACION	PROGRAMACION AÑO 2022		SEGUIMIENTO AÑO 2022	
				MES ANUAL	PONDERACION	TOTAL SEGUIMIENTO	
C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado	Unidades Distales de Tránsito-UDT equipadas	8.00	10.00	8.00	8.00	0.00	
C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado	Unidades de Control de Tránsito-UCT equipadas	18.00	10.00	8.00	3.12	0.00	
C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado	Centros de Retención Vehicular-CRV equipados	21.00	10.00	8.00	2.38	0.00	
C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado	Puntos de control equipados e implementados	424.00	28.00	313.00	18.48	0.00	
C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado	Razones móviles adquiridas e integradas	19.00	10.00	9.00	4.74	0.00	
C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado	Agentes de tránsito dotados con dispositivos de control (hand held y bodycam)	2383.00	20.00	2383.00	20.00	0.00	
CC. Sala de control y monitoreo implementado	Puestos de control y monitoreo implementados	16.00	18.00	16.00	18.00	0.00	
		100.00		81.88		0.00	

Guardar Cancelar

El usuario debe registrar las **unidades** ejecutadas y las **observaciones** en el trimestre correspondiente en cada uno de los componentes y productos según la programación realizada por la entidad; para lo cual el usuario debe dar clic en el icono

El sistema habilita la pantalla “**DETALLE COMPONENTES**” y en la sección “**Seguimiento Año 2024 (Avance Físico)**”, el usuario debe registrar las **unidades ejecutadas** y las **observaciones** para el trimestre correspondiente.

El usuario da clic en la opción “**Guardar**”.

PROGRAMACION DE PROYECTOS

DETALLE COMPONENTES

CUP: 50680000.0000.387096

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO EN LA RVE

Avance Acumulado Real: 0.00

COMPONENTE MARCO LOGICO: C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado

PRODUCTO: Unidades Operativas de Tránsito-UDT ejecutadas

META TOTAL: 500. Ejemplo: 500.25, máximo 2 decimales.

PONDERACION: 10.0

PROGRAMACION AÑO 2022									
META ANUAL	PONDERACION	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4	
		UNIDADES	PONDERACION	UNIDADES	PONDERACION	UNIDADES	PONDERACION	UNIDADES	PONDERACION
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO AÑO 2022 (Avance Físico)												
TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			TOTAL SEGUIMIENTO
UNIDADES	PONDERACION	OBSERVACIONES	UNIDADES	PONDERACION	OBSERVACIONES	UNIDADES	PONDERACION	OBSERVACIONES	UNIDADES	PONDERACION	OBSERVACIONES	
0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Guardar Cancelar

Registrar unidades ejecutadas

Registrar observaciones cortas

El sistema presenta la pantalla “**DETALLE DE COMPONENTES**”. (El usuario debe ingresar la información de todos los componentes y productos programados por la entidad).

Una vez registrada toda la información de todos los componentes y productos, el usuario debe dar clic en la opción “**Guardar**”.

El sistema habilita la pantalla “**PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS**” y en la sección “**EJECUCIÓN DEL PROYECTO**”, el usuario selecciona uno de los siguientes estados:

En ejecución: Proyecto que avanza conforme lo programado.

No inicia: Proyecto que aún no inicia la etapa de ejecución, debido a factores como contratación del equipo técnico, adquisición de bienes inmuebles, recorte presupuestario, demoras en el proceso de contratación, entre otros.

Paralizado: Proyecto detenido como resultado de la no ejecución de actividades según lo programado.

Finalizado: Proyecto que ha culminado la fase de ejecución de metas.

EJECUCION PROYECTO

Ejecución Primer Trimestre	Ejecución Segundo Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Ejecución Cuarto Trimestre
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Avance 2022		0.00 %	
Avance Total Acumulado		0.00 %	
Estado		EN EJECUCION	

Una vez seleccionado el estado, el usuario en la sección “**LOGROS Y NUDOS CRÍTICOS**” debe registrar los logros y nudos críticos de impacto relevante que se presentaron durante el trimestre reportado.

LOGROS Y NUDOS CRÍTICOS

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Guardar
Cancelar

 **Importante:** La sección de “Logros y Nudos Críticos”, contendrá de manera global, en términos cualitativos, cuantitativos y de impacto los resultados del proyecto, debe incluir el número de beneficiarios, para lo cual tomará como insumo los avances de cada uno de sus componentes. De existir algún nudo crítico se debe señalar; los motivos o novedades presentadas y se recomienda usar el siguiente formato:



Logros: 200 viviendas construidas / 15 kilómetros de carretes asfaltadas / 830 niños(as) atendidos en CIBVs / 1.278 docentes beneficiarios de los programas de formación / 7 Institutos Tecnológicos Superiores reconvertidos beneficiando a 19.179 estudiantes / etc.

Nudos: Falta de asignación presupuestaria / La obra está paralizado por incumplimiento del contratista XYs / etc.



Nota: Esta sección es de registro obligatorio, caso contrario el sistema no permitirá guardar la información previamente registrada. En estos campos se debe dejar constancia de los resultados alcanzados por el proyecto en el periodo analizado, así como, señalar los nudos críticos o alertas que inciden en la ejecución del mismo.

Finalmente, una vez registrada la información, el usuario dar clic en la opción “**Guardar**” y en ese momento el sistema presenta un mensaje indicando que la información se encuentra guardada correctamente; caso contrario generará las alertas respectivas.



PROGRAMACION DE PROYECTOS

Criterios de Búsqueda

CUP:

Nombre Proyecto:

Listado de Proyectos

CUP	Nombre Proyecto	Unidad Ejecutora	Programación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
50680000.0000.387096	IMPLEMENTACION DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO EN LA RVE	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR - PLANTA CENTRAL					
50680000.0000.387099	REPOTENCIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y OPERATIVA DE LA CTE	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR - PLANTA CENTRAL					

9. Reportes

En el submenú “**SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**” (revisar numeral 6 del presente manual), el sistema presenta la opción “**REPORTES GASTO NO PERMANENTE**”.

Al seleccionar la opción “**REPORTE GASTO NO PERMANENTE**”, el sistema presenta la pantalla “**REPORTES DE PROYECTOS**”, que contiene los siguientes criterios de búsquedas:

- CUP
- Nombre del proyecto

9.1 Reporte por proyecto

El sistema despliega el listado de proyectos que han sido reportados por la institución, tanto en las fases de programación como seguimiento.

Cuando aparece el ícono “Visto”  , significa que el reporte de proyectos ha sido completado con éxito.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO_EVALUACION

Opción seleccionada: SEGUIMIENTO_EVALUACION > SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL > REPORTES GASTO NO PERMANENTE > REPORTES GASTO NO PERMANENTE >

GASTO NO PERMANENTE **REPORTES DE PROYECTOS**

GASTO PERMANENTE Criterios de Búsqueda

CUP:

Nombre Proyecto:

Buscar Limpiar

REPORTES GASTO NO PERMANENTE

REPORTES GASTO PERMANENTE

Listado de Proyectos

CUP	Nombre Proyecto	Unidad Ejecutora	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Reporte
033520000.0000.375759	ESTUDIOS DE LAS DINÁMICAS Y DESPLAZAMIENTOS ESTACIONALES DE MASAS DE AGUAS EN EL PERFIL COSTERO CONTINENTAL DEL ECUADOR, MEDIANTE MODELAMIENTOS Y SIMULACIONES DE PLUMAS DE DISPERSIÓN	SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION PLANIFICA ECUADOR - PLANTA CENTRAL	✓	✓			
30200000.983.4238	ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE- PEDRO CARBO	SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION PLANIFICA ECUADOR - PLANTA CENTRAL	✓	✓			

Generar reporte excel de todos los Proyectos

El usuario puede descargarse el registro de los avances por proyecto dando clic en el ícono **Descarga** , obteniéndose la información en archivo PDF.

SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 09 February 2022

PERIODO 2022

INSTITUCION	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		
RUC	1760001120001		
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR		

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE RECUPERACIÓN DE ADICIONES		
CUP	123200000.0000.374536	FECHA FIN	2020-12-31
FECHA INICIO	2013-01-01	MONTO TOTAL	34.674.598.00
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de Inversiones y modernización del sistema financiero nacional.		
POLITICA	2.1 Fortalecer vínculos comerciales con socios y países de mercados potenciales que permitan un libre comercio y la consolidación de las exportaciones no petroleras.		
META	2.1.1. Incrementar las exportaciones alta, media, baja intensidad tecnológica per cápita de 42.38 al 51.31.		
ESTADO EN EJECUCION	CODIFICADO USD 2022	DEVENGADO I TRIMESTRE	DEVENGADO II TRIMESTRE
	34.240.84	0.00	0.00

DATOS HISTORICOS	Avance al 2018	70.41 %
	Avance al 2021	80.00 %

PROGRAMACION 2022		EJECUCION 2022	
Primer Trimestre	0.00 %	Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %	Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %	Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	2.00 %	Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	2.00 %	Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	PROGRAMACION 2022				
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III T		
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD
		100.0	100.00	2.0	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
			100.00		2.00		0.00		0.00	

9.2 Reporte consolidado

El sistema permite generar reportes en formato Excel, de todos los proyectos reportados por la entidad, para esto se utilizará el botón **“Generar reporte Excel de todos los proyectos”**.

REPORTES DE PROYECTOS

Criterios de Búsqueda

CUP:

Nombre Proyecto:

Listado de Proyectos

CUP	Nombre Proyecto	Unidad Ejecutora	Programación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Reporte
123200000.0000.374536	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE RECUPERACIÓN DE ADICCIONES	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL						
123200000.0000.374537	FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL						
123200000.0000.374560	ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIVEL NACIONAL	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL						
123200000.0000.381243	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL						

El usuario debe dar clic en **Generar reporte Excel de todos los Proyectos** y el sistema genere el reporte en formato Excel.

PROYECTO	CUP	ESTADO	AÑO AVANCE	AVANCE	AÑO PROG.	PROG. ENIC.	PROG. ENIC.	PROG. ENIC.	PROG. TOTAL	PROG. ENIC.	EJECUTADO	ENIC.	EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO	LOGROS IS	LOGROS IS	
COMPONENTE	PROYECTO	META TOTAL	PONDERADO META ANUAL	PONDERADO	UNIDAD IS	PONDERADO IS	TOTAL C.A.E.										
8	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	1900000 208.492	ENEJECUCION	2016	53,00	2016	9,37	93,50	29,30	9,37	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00
9	Fortalecer los procesos educativos, fomentar para promover el desarrollo integral de los estudiantes del sistema educativo nacional, la convivencia armónica y su vinculación con la comunidad	1900000 208.492	ENEJECUCION	2016	53,00	2016	9,37	93,50	29,30	9,37	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00
10	COMPONENTE	PROYECTO	META TOTAL	PONDERADO META ANUAL	PONDERADO	UNIDAD IS	UNIDAD IS	UNIDAD IS	UNIDAD IS	PONDERADO IS	TOTAL C.A.E.						
11	Reducción de riesgos ante los desastres naturales en el nivel educativo	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
12	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
13	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
14	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
15	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
16	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
17	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
18	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
19	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
20	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
21	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
22	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
23	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
24	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
25	Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y recuperación de la comunidad educativa en caso de desastres	1900000 0000 312705	ENEJECUCION	2016	90,00	2016	9,84	13,84	23,88	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00

Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional Gasto No Permanente

Subsecretaría de Seguimiento
Dirección de Seguimiento a la Inversión
Secretaría Nacional de Planificación





EL NUEVO
ECUADOR 

**Secretaría Nacional
de Planificación**

 @PlanificacionEc  @PlanificacionEc  @PlanificacionEc

www.planificación.gob.ec
