

Seguimiento a estudios, programas y proyectos de inversión

***Dirección de Seguimiento a la Inversión
Subsecretaría de Seguimiento***



**EL NUEVO
ECUADOR**

Secretaría Nacional
de Planificación

Lineamientos de Programación 2024 y Seguimiento a estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones, al primer trimestre 2024

(Gasto No Permanente)



**EL NUEVO
ECUADOR**

Secretaría Nacional
de Planificación



/

Contenido:

1. Metodología de Seguimiento
2. Programación de Metas Físicas y Presupuestarias
3. Seguimiento de Metas Físicas
4. Recomendaciones Generales

Secretaría Nacional de Planificación



1. Metodología de Seguimiento

1. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

Metodología de Seguimiento al Avance Físico



Mediante Acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0008-A, de 16 de febrero de 2022, el Ente Rector de la Planificación emitió la **“Metodología de seguimiento al avance físico de estudios, programas y proyectos de inversión”**, que contempla el ciclo de seguimiento.


El objetivo es establecer los aspectos metodológicos que orientan el proceso de programación y seguimiento al avance físico de estudios, programas y proyectos de inversión al que se sujetan las entidades del sector público.

Secretaría Nacional de Planificación



1. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

Ciclo del Proyecto

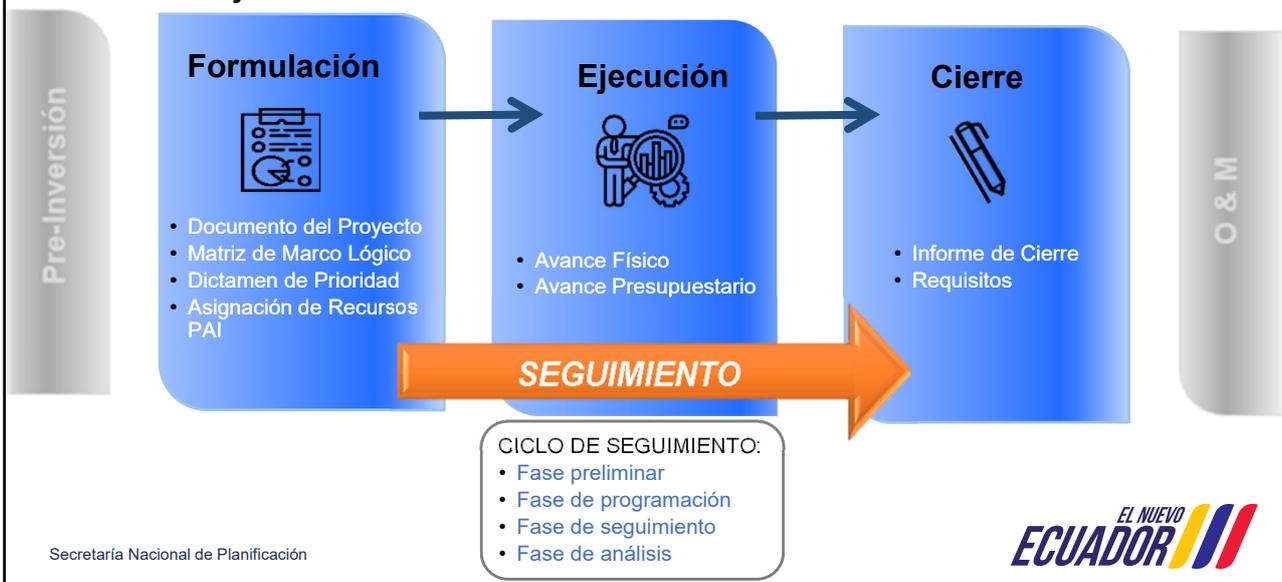

Secretaría Nacional de Planificación



1. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

Ciclo de Seguimiento

Fase Preliminar ✓

- Se establece los estudios, programas y proyectos de inversión que serán incluidos en el módulo de seguimiento del SIPeIP.

Fase Programación 📊

- Las entidades realizan la programación anual de METAS físicas y presupuestarias.

Fase Seguimiento 🔗

- Las entidades ingresan la información de los resultados del avance físico en el módulo de seguimiento del SIPeIP.

Fase de Análisis 📈

- Se realiza el análisis comparativo entre la PROGRAMACIÓN y el SEGUIMIENTO del avance de metas físicas y ejecución presupuestaria.
- Se identifican sus principales logros y **alertas**.

Secretaría Nacional de Planificación

EL NUEVO
ECUADOR



2. Programación de Metas Físicas y Presupuestarias

2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Programación Anual

Las entidades ejecutoras de estudios, programas y proyectos de inversión que **fueron incluidos en el Plan Anual de Inversiones - PAI durante los meses de enero, febrero o marzo de 2024** y/o que cuentan con presupuesto codificado a partir de dichos meses, deberán realizar la Programación anual de metas físicas y presupuestarias, previo al registro del seguimiento.



Secretaría Nacional de Planificación



2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Registro de Indicadores de Componentes

Para realizar la PROGRAMACIÓN, se deberá tomar en cuenta los **Indicadores (productos o entregables) establecidos en los componentes de la matriz de marco lógico** del documento del proyecto aprobado en la emisión del dictamen de prioridad o su actualización de prioridad vigente.

| Matriz de Marco Lógico | | | |
|--|-------------|------------------------|-----------|
| Resumen Narrativo | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| Fin (objetivo de desarrollo) | | | |
| Propósito (objetivo general) | | | |
| Componentes (objetivos específicos) | | | |
| Actividades (presupuesto) | | | |

Se registrará a nivel de componentes, los indicadores con sus metas totales en la unidad de medida, de acuerdo a la información que consta en el marco lógico.

Secretaría Nacional de Planificación



2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Registro de Indicadores de Componentes

El Documento del Proyecto que contiene el Marco Lógico vigente, se descarga del módulo de Inversión del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública SIPEIP, de acuerdo con la fecha de emisión del dictamen de prioridad o su actualización de prioridad vigente.

Secretaría Nacional de Planificación **SIPEIP - Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública**

SEGUIMIENTO A PROYECTOS INVERSIÓN SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN PLANIFICACIÓN

Visualizar Proyecto

Datos Generales Marco Lógico Ubicación Geográfica Indicadores Alineación al PND Estudios Técnicos Financiamiento

Lista de Estudios Técnicos

| Nombre del Documento | Contenido | Observaciones | Fecha | Opciones |
|---|---|---|------------|----------|
| 2021-12-22_12-48-39_CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS DE PROYECTOS PARA LA SOL. DE DICTAMEN DE PRIORIDAD BPP.PDF | • VARIOS | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS DE PROYECTOS PARA LA SOL. DE DICTAMEN DE P | 22/12/2021 | |
| 2021-12-23_10-24-59_DOCUMENTO PRP 2022-2025 23 DIC 2021.PDF | <ul style="list-style-type: none"> • VIABILIDAD TÉCNICA • VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONOMICA • ORIGEN DE LOS INSUMOS • MONITOREO DE LA EJECUCIÓN • LINEA BASE DEL PROYECTO • IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA • IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACION OBJETIVO • EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTO • ESTRUCTURA OPERATIVA • DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO • ARRIBLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCION • ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD • ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA • ACTUALIZACION DE LINEA BASE | DOCUMENTO PRP 2022-2025 21 DIC 2021 | 23/12/2021 | |

Secretaría Nacional de Planificación

2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Registro de Indicadores de Componentes

Dentro del Documento del Proyecto priorizado o actualizado, se toma la información de los componentes de la Matriz de Marco Lógico.

| MATRIZ DE MARCO LÓGICO | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---|
| RESUMEN NARRATIVO DE LOS OBJETIVOS | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
| COMPONENTES | COMPONENTE 1. Promover procesos locales de restauración del paisaje. | Hasta diciembre del 2020 se contará con al menos 5 instrumentos legales que respalden la restauración de 30000 ha en el territorio continental del Ecuador ejecutadas con fondo fiscal, y con fondos de cooperación. | Instrumentos legales (convenios, acuerdos, contratos, etc.) firmados entre MAATE, Cooperante y Ejecutor, con fines de restauración del paisaje. | No se cuenta con fondos fiscales para ejecución de procesos de restauración. No se cuenta con fondos de cooperación internacional. |
| | COMPONENTE 2. Establecer procedimientos institucionales específicos y normados para implementar procesos de restauración del paisaje en territorio. | Hasta diciembre de 2025 se contará con la evaluación a la ejecución y actualización del Plan Nacional de Restauración Forestal 2019-2030. Hasta el 2025 se habrán fortalecido las capacidades del equipo del proyecto de Restauración del paisaje y de otros actores como ejecutores y beneficiarios a través de 3 capacitaciones en territorio, para lograr la mejora de implementación y la sostenibilidad de los procesos locales de restauración del paisaje. Hasta el 2024 se contará con 1 módulo de seguimiento y reporte vinculado al sistema único de información ambiental y al sistema de monitoreo de bosques. | Plan Nacional de Restauración Forestal 2019-2030 evaluado y actualizado. Registro de participantes de las capacitaciones. Actas de capacitación con registro fotográfico. Módulo de seguimiento y reporte vinculado al sistema único de información ambiental y al sistema de monitoreo de bosques. | No existe decisión política para oficializar la actualización del Plan Nacional. No existe voluntad por parte de actores públicos o privados, naturales o jurídicos de participaren las capacitaciones. Falta de recursos para el desarrollo de las capacitaciones. Procesos burocráticos que obstaculicen la aprobación de productos. |
| | COMPONENTE 3. Ejecutar medidas de compensación vinculada a la responsabilidad socioambiental de la empresa privada mediante acciones relacionadas a la restauración del paisaje | Hasta el año 2023 se contará con propuesta de un mecanismo de compensación para ejecución y monitoreo de procesos de restauración con enfoque de responsabilidad socioambiental bajo los lineamientos de la autoridad ambiental. | Documento que contiene el mecanismo de compensación para ejecución y monitoreo de procesos de restauración del paisaje con enfoque de responsabilidad socioambiental. | No existe interés o recursos por parte de la empresa privada para vincularse a los procesos de restauración por pago de compensación. |

Secretaría Nacional de Planificación

2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Registro de Indicadores de Componentes

Esa misma información es la que se carga en el Módulo de Seguimiento del SIPeIP.

| COMPONENTE MARCO LOGICO | PRODUCTO | META TOTAL | PONDERACION |
|--|--|------------|-------------|
| C1: Promover procesos locales de restauración del paisaje. | Hasta diciembre del 2025 se contará con al menos 5 instrumentos legales que respalden la restauración de 30000 ha en el territorio continental del Ecuador. | 5.00 | 40.00 |
| C2: Establecer procedimientos institucionales específicos y normados para implementar procesos de restauración del paisaje en territorio. | Hasta diciembre del 2023 se contará con la evaluación Nacional del paisaje. | 1.00 | 20.00 |
| C2: Establecer procedimientos institucionales específicos y normados para implementar procesos de restauración del paisaje en territorio. | Hasta el 2024 se contará con el proyecto de restauración del paisaje y de otros actores como beneficiarios. | 3.00 | 10.00 |
| C2: Establecer procedimientos institucionales específicos y normados para implementar procesos de restauración del paisaje en territorio. | Hasta el 2024 se contará con 1 módulo de seguimiento y reporte vinculado al sistema único de información ambiental y al sistema de monitoreo de bosques. | 1.00 | 10.00 |
| C3: Ejecutar medidas de compensación vinculada a la responsabilidad socioambiental de la empresa privada mediante acciones relacionadas a la restauración del paisaje. | Hasta el año 2023 se contará con propuesta de un mecanismo de compensación para ejecución y monitoreo de procesos de restauración con enfoque de responsabilidad socioambiental. | 1.00 | 20.00 |

Estructura del Marco Lógico Priorizado / Actualizado


Secretaría Nacional de Planificación



2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Verificación del Avance Físico

Para cada uno de los indicadores de los componentes del Marco Lógico del Proyecto, se debe determinar la cantidad de ejecución física con corte a una fecha determinada.

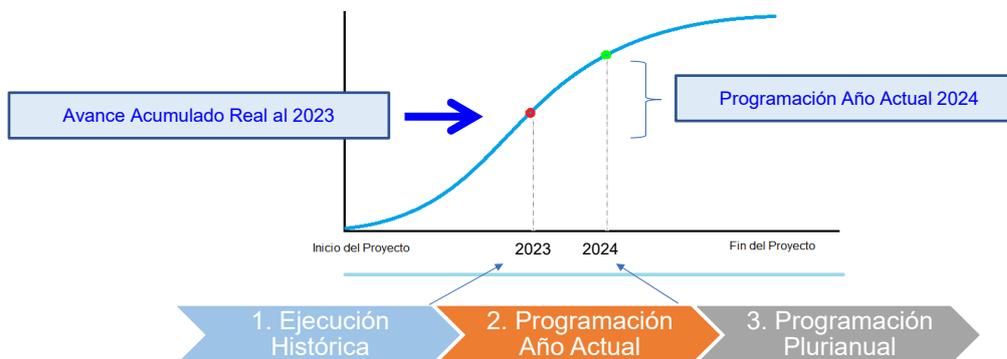

Para realizar la PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS, se utilizará la Hoja auxiliar de cálculo anexa a los "Lineamientos para actualización de Información del Módulo de Seguimiento – Gasto No Permanente" disponible en la página WEB institucional: <https://www.planificacion.gob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-inversion-publica/>

Secretaría Nacional de Planificación



2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Programación Plurianual

| ESTRUCTURA DE METAS POR COMPONENTES (Según Marco Lógico de Dictamen de Prioridad / Actualización) | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Componente | Indicador | Meta Total del Proyecto (A) | Unidad | Ponderación (%) (B) |
| COMPONENTE 1 | | | | |
| 35,0% | | | | |
| Componente 1 | Indicador 1.1 | 300.000,0 | Libros | 5,0% |
| Componente 1 | Indicador 1.2 | 200.000,0 | Estudiantes | 10,0% |
| Componente 1 | Indicador 1.3 | 100.000,0 | Profesores | 20,0% |
| COMPONENTE 2 | | | | |
| 15,0% | | | | |
| Componente 2 | Indicador 2.1 | - | - | 5,0% |
| Componente 2 | Indicador 2.2 | - | - | 5,0% |
| Componente 2 | Indicador 2.3 | - | - | 5,0% |
| COMPONENTE 3 | | | | |
| 20,0% | | | | |
| Componente 3 | Indicador 3.1 | 8.000,0 | Ha | 10,0% |
| Componente 3 | Indicador 3.2 | 4.500,0 | litros | 5,0% |
| Componente 3 | Indicador 3.3 | - | unidades | 5,0% |
| COMPONENTE 4 | | | | |
| 15,0% | | | | |
| Componente 4 | Indicador 4.1 | 300,0 | Casas | 5,0% |
| Componente 4 | Indicador 4.2 | 7.000,0 | km | 10,0% |
| Componente 4 | Indicador 4.3 | - | - | 0,0% |
| COMPONENTE 5 | | | | |
| 15,0% | | | | |
| Componente 5 | Indicador 5.1 | 1.500,0 | Libros | 15,0% |
| Componente 5 | Indicador 5.2 | - | - | 0,0% |
| Componente 5 | Indicador 5.3 | - | - | 0,0% |

Estructura del Marco Lógico Priorizado / Actualizado

| PROGRAMACIÓN PLURIANUAL (Periodo de ejecución planificado) | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| AÑO 2024 | | AÑO 2025 | | AÑO 2026 | | AÑO 2027 | |
| Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado |
| - | 1,8% | - | 6,0% | - | 5,3% | - | - |
| 50.000,0 | 0,8% | 30.000,0 | 0,5% | 20.000,0 | 0,3% | - | - |
| 20.000,0 | 1,0% | 10.000,0 | 0,5% | - | - | - | - |
| - | - | 25.000,0 | 5,0% | 25.000,0 | 5,0% | - | - |
| - | 1,5% | - | 1,5% | - | 1,5% | - | 0,5% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20,0 | 0,5% | 20,0 | 0,5% | - | - | - | - |
| 100,0 | 1,0% | 100,0 | 1,0% | 150,0 | 1,5% | 50,0 | 0,5% |
| - | - | - | 4,0% | - | 7,8% | - | 2,8% |
| - | - | 40,0 | 4,0% | 50,0 | 5,0% | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1.000,0 | 0,6% |
| - | - | - | - | 2.500,0 | 2,8% | 2.000,0 | 2,2% |
| - | - | - | 0,7% | - | 7,6% | - | 2,8% |
| - | - | - | - | 200,0 | 3,3% | 80,0 | 1,3% |
| - | - | 500,0 | 0,7% | 3.000,0 | 4,3% | 1.000,0 | 1,4% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 5,0% | - | 5,0% |
| - | - | - | - | 500,0 | 5,0% | 500,0 | 5,0% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

3,33% 12,21% 27,23% 11,11%

Secretaría Nacional de Planificación

2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Cálculo del Avance Acumulado Real al año 2023

1. Ejecución Histórica

Estructura del Marco Lógico Priorizado / Actualizado

| EJECUCIÓN ANUAL HISTÓRICA (Desde el año de inicio de la ejecución del proyecto hasta el año 2023) | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|--------------------------|
| AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | Ejecución Acumulada (C) | % Total cumplimiento (*) |
| 50.000,0 | 30.000,0 | 40.000,0 | 50.000,0 | - | - | - | - | - | 170.000,0 | 16,4% |
| 20.000,0 | 20.000,0 | 20.000,0 | 20.000,0 | 20.000,0 | 20.000,0 | - | - | - | 120.000,0 | 6,0% |
| - | - | - | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 5.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | 38.000,0 | 7,6% |
| - | 20,0 | - | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - | - | 80,0 | 5,0% |
| - | - | 50,0 | - | 20,0 | 20,0 | 10,0 | - | - | 100,0 | 2,5% |
| - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | 0,1% |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5% |
| - | - | - | - | 2.000,0 | 2.000,0 | - | - | - | 4.000,0 | 2,5% |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2% |
| - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 20,0 | 0,3% |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000,0 | 2.000,0 | 2,9% |

Avance Acumulado Real al 2023: 29,72%

Secretaría Nacional de Planificación

2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Cálculo de la Programación del año 2024

1. Ejecución
Histórica

2. Programación
Año Actual

3. Programación
Plurianual

| PROGRAMACIÓN 2024 | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Meta Anual Programada (C) | % Meta Anual Ponderada $D=(C/A)*B$ | Programado 1er.Trimestre | | Programado 2do.Trimestre | | Programado 3er.Trimestre | | Programado 4to.Trimestre | | Total Acumulado | % Ponderado |
| | | Unidades | % Ponderado | | |
| | 5,4% | | 1,0% | | 0,7% | | 0,8% | | 2,9% | | 5,4% |
| 30.000,0 | 0,5% | - | - | 10.000,0 | 0,2% | 20.000,0 | 0,3% | - | - | 30.000,0 | 0,5% |
| 50.000,0 | 2,5% | 20.000,0 | 1,0% | 10.000,0 | 0,5% | 10.000,0 | 0,5% | 10.000,0 | 0,5% | 50.000,0 | 2,5% |
| 12.000,0 | 2,4% | - | - | - | - | - | - | 12.000,0 | 2,4% | 12.000,0 | 2,4% |
| | 2,4% | | 1,0% | | 1,0% | | 0,2% | | 0,2% | | 2,4% |
| - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60,0 | 1,5% | 40,0 | 1,0% | 20,0 | 0,5% | - | - | - | - | 60,0 | 1,5% |
| 90,0 | 0,9% | - | - | 50,0 | 0,5% | 20,0 | 0,2% | 20,0 | 0,2% | 90,0 | 0,9% |
| | 2,9% | | - | | 0,6% | | 2,3% | | - | | 2,9% |
| 10,0 | 1,0% | - | - | - | - | 10,0 | 1,0% | - | - | 10,0 | 1,0% |
| 3.000,0 | 1,9% | - | - | 1.000,0 | 0,6% | 2.000,0 | 1,3% | - | - | 3.000,0 | 1,9% |
| - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,7% | | 0,1% | | 0,1% | | 0,3% | | 0,1% | | 0,7% |
| - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500,0 | 0,7% | 100,0 | 0,1% | 100,0 | 0,1% | 200,0 | 0,3% | 100,0 | 0,1% | 500,0 | 0,7% |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5,0% | | 0,3% | | 0,5% | | 2,0% | | 2,3% | | 5,0% |
| 500,0 | 5,0% | 25,0 | 0,3% | 50,0 | 0,5% | 200,0 | 2,0% | 225,0 | 2,3% | 500,0 | 5,0% |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 16,39% | | 2,39% | | 2,93% | | 5,57% | | 5,49% | | 16,39% |

Estructura del Marco Lógico
Priorizado / Actualizado

Secretaría Nacional de Planificación

2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Programación en el Módulo de Seguimiento SIPeIP

Para ingresar al Módulo de Seguimiento del sistema SIPeIP, a través de la página WEB institucional:
<https://www.planificacion.gob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-inversion-publica/>

Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública



Planificación
ingrese aquí

Inversión
ingrese aquí

Seguimiento A Obras
ingrese aquí

Seguimiento a la Planificación
Institucional
ingrese aquí

Este Sistema solo es compatible con el navegador Firefox 91.8.0
 A continuación, puedes descargar el instalador del navegador Firefox según tu sistema operativo:

Windows x32 Windows x64 Linux Mac

Descarga y revisa el manual de instalación

Secretaría Nacional de Planificación

EL NUEVO
ECUADOR

2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Programación en el Módulo de Seguimiento SIPeIP

- Sitúe el mouse en la palabra SEGUIMIENTO_EVALUACIÓN, automáticamente se desplegará el Submenú SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, haga clic ahí.



- Se desplegará un Submenú, elija GASTO NO PERMANENTE / PROGRAMACIÓN Y AVANCES DE PROYECTOS y haga clic.



2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Programación en el Módulo de Seguimiento SIPeIP

Verificar los proyectos que forman parte del PAI 2024, de los cuales se va a registrar el Seguimiento correspondiente al Primer Trimestre 2024.

| PROGRAMACION DE PROYECTOS | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Listado de Proyectos | | | | | | | |
| CUP | Nombre Proyecto | Unidad Ejecutora | Programación | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
| 91480000.0000.387211 | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | ✓ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ |
| 91480000.0000.387224 | OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | ✓ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ |
| 91480000.0000.387225 | ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO 2022-2025 | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | ✓ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ |
| 91480000.0000.388416 | ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON MIRAS A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | ✓ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ |

Secretaría Nacional de Planificación



2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Programación en el Módulo de Seguimiento SIPeIP

- Se visualizará la información general del proyecto

| PROGRAMACION DE PROYECTOS | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DATOS GENERALES | | | | |
| Nombre del Proyecto SISTEMA ECUATORIANO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | |
| CUP | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto Total | |
| 091590000.0000.387067 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 5,755,201.75 | |
| PRESUPUESTO E-SIGEF | | | | |
| Codificado USD 2024 | Devengado USD Trimestre 1 | Devengado USD Trimestre 2 2024 | Devengado USD Trimestre 3 2024 | Devengado USD Trimestre 4 2024 |
| 805,409.69 | 733,384.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLAN DE DESARROLLO PARA EL NUEVO ECUADOR 2024 - 2025 | | | | |
| OBJETIVO PND 2024-2025 | Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios | | | |
| POLITICA | 2.2 Promover una educación de calidad con un enfoque innovador, competencial, inclusivo, resiliente y participativo, e | | | |
| META | 2.2.1 Incrementar el porcentaje de víctimas de violencia sexual detectadas o cometidas en el ámbito educativo y qu | | | |

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo.- La entidad debe alinear cada estudio, programa o proyecto a uno de los 9 **Objetivos** del Plan Nacional de Desarrollo (PND) "Para el Nuevo Ecuador 2024-2025"; así como también, se debe alinear a una **Política** y **Meta**, en función del objetivo escogido.

Dicha alineación debe ser consistente con la información del documento del proyecto priorizado.



Secretaría Nacional de Planificación

2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Verificación del Avance Físico Real

La entidad deberá verificar si el valor del **Avance Acumulado año anterior** es el mismo que el **Avance Acumulado Real** calculado con la hoja auxiliar.

| EJECUCION HISTORICA | |
|--------------------------------------|--|
| Avance Acumulado año Anterior | 12.50 % |
| Avance Acumulado Real (Año anterior) | 14.07 %* |
| Archivo de justificación | |
| Adjuntar archivo | Anexo 4. Formato Informe justificativo ajuste del avance acumulado real de proyectos |

Si existe diferencia, se deberá actualizar el valor del **Avance Acumulado Real (Año Anterior)** y subir un informe justificativo de acuerdo al Formato de Informe para ajuste del avance acumulado real (Anexo 1) de los "Lineamientos para actualización de Información del Módulo de Seguimiento – Gasto No Permanente" disponible en la página WEB institucional.

Seguimiento a la Inversión

Metodología de Seguimiento a Proyectos

Lineamientos para actualización de Información Módulo Seguimiento – Gasto No Permanente



Secretaría Nacional de Planificación

2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Programación en el Módulo de Seguimiento SIPeIP

- **Programación de Metas Físicas:** Para ingresar la Programación de metas físicas, haga clic en el ícono de lápiz al costado de "Programación Anual".

PROGRAMACION PROYECTO

Programación anual 2024  Metas Físicas 24.07 % *

Metas Presupuestaria 100.00 %

| Programación Primer Trimestre | Programación Segundo Trimestre | Programación Tercero Trimestre | Programación Cuarto Trimestre |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| METAS FÍSICAS | | | |
| 5.01 % * | 5.01 % | 5.12 % | 8.93 % |
| METAS PRESUPUESTARIAS | | | |
| 25.00 % *  | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % |

- **Programación de Metas Presupuestarias.** En el Módulo de Seguimiento del SIPeIP las entidades ejecutoras ingresarán la Programación Presupuestaria para el año 2024 de los estudios, programas y proyectos de inversión que fueron incluidos en el PAI 2024.
Para el cálculo de la programación del porcentaje de ejecución trimestral, se debe considerar el monto a devengar, con relación al monto Codificado: **(Monto a Devengar / Codificado) *100**

Secretaría Nacional de Planificación



2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Ejemplo Programación Presupuestaria

PROGRAMACION DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

| Nombre del Proyecto | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SISTEMA ECUATORIANO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | |
| CUP | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto Total | |
| 091590000.0000.387067 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 5,755,201.75 | |
| PRESUPUESTO E-SIGEF | | | | |
| Codificado USD 2024 | Devengado USD Trimestre 1 | Devengado USD Trimestre 2 2024 | Devengado USD Trimestre 3 2024 | Devengado USD Trimestre 4 2024 |
| 800.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(Monto a Devengar / Codificado) *100

Monto Codificado 2024 : 800,000,00 USD

Monto Devengado 1T-2024: 100,000,00 USD

META PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE: 12,50%

| Programación Primer Trimestre | Programación Segundo Trimestre | Programación Tercero Trimestre | Programación Cuarto Tr |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| METAS PRESUPUESTARIAS | | | |
| 12.50 % * | 12.50 % | 25.00 % | 50.00 % |
| Programación anual 2024 | | 100.00 % | |

Secretaría Nacional de Planificación



2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Programación en el Módulo de Seguimiento SIPeIP

- Se desplegarán todos los componentes e indicadores (PRODUCTOS) del Marco Lógico del Proyecto, que fueron ingresados en el Módulo de Seguimiento el año anterior. En caso de no tener pre-cargada la información, se deberá utilizar el botón “Nuevo” para cargar cada uno de los componentes.
- Para ingresar la programación haga clic en el lápiz del costado derecho.

| COMPONENTE MARCO LOGICO | PRODUCTO | META TOTAL | PONDERACION | PROGRAMACION AÑO 2024 | | SEGUIMIENTO AÑO 2024 | |
|-----------------------------------|---|------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|--|
| | | | | META ANUAL | PONDERACION | TOTAL SEGUIMIENTO | |
| C1. ADQUISICIÓN DE 08 AERONAVES. | Al año 2024, se dispondrá de 8 aeronaves de entrenamiento y 1 sistema simulador de vuelo. | 9.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C2. SOPORTE LOGÍSTICO. | Al año 2024, se dispondrá del 100% del soporte logístico, para garantizar una disponibilidad de aeronaves de al menos el 80%. | 100.00 | 12.00 | 1.00 | 0.12 | 0.12 | |
| C3. CAPACITACIÓN PERSONAL. | Hasta el año 2023, se capacitará a 5 pilotos para la operación de las aeronaves, y a 20 técnicos para el mantenimiento especializado de los sistemas de las aeronaves, en la casa fabricante. | 25.00 | 24.00 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | |
| C4. PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL. | Para el año 2023 se realizará el estudio ambiental y ejecución de un plan de mitigación ambiental para la operación de las nuevas aeronaves. | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
| | | 100.00 | | 5.00 | | 5.00 | |

[Nuevo](#) [Guardar](#) [Cancelar](#)

Recuerde ingresar la información de TODOS LOS INDICADORES.

Secretaría Nacional de Planificación



2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

- De cada uno de los indicadores, aparecerá la siguiente pantalla.
- Ingrese el valor de la META ANUAL y distribuya la programación en cada trimestre. Guarde la información.

| PROGRAMACION AÑO | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| META ANUAL | PONDERACION | TRIMESTRE 1 | | TRIMESTRE 2 | | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | |
| | | UNIDADES | PONDERACION | UNIDADES | PONDERACION | UNIDADES | PONDERACION | UNIDADES | PONDERACION |
| 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.00 | 5.0 | 0.00 | 5.0 | 0.00 |

| SEGUIMIENTO AÑO (Avance Físico) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| TRIMESTRE 1 | | | TRIMESTRE 2 | | | TRIMESTRE 3 | | | TRIMESTRE 4 | | |
| UNIDADES | PONDERACION | OBSERVACIONES | UNIDADES | PONDERACION | OBSERVACIONES | UNIDADES | PONDERACION | OBSERVACIONES | UNIDADES | PONDERACION | OBSERVACIONES |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |

[Guardar](#) [Cancelar](#)

- Por esta ocasión, se requiere ingresar el valor ejecutado en cada indicador, correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2024.
- Las unidades deben estar acorde a la programación, y no puede superar la meta anual.
- Si no se ejecutó dicho indicador, coloque 0 (cero) y no olvide llenar el campo OBSERVACIONES.

Recuerde: En el campo Observaciones detalle información relevante sin frases genéricas.

Secretaría Nacional de Planificación



2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Programación

Recuerde que para cada uno de los indicadores/Productos, se debe ingresar el valor de la META ANUAL y especificar la planificación trimestral.

| PROGRAMACIÓN 2024 | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Meta Anual Programada (C) | % Meta Anual Ponderada (C/A1%) | Programado 1er.Trimestre | | Programado 2do.Trimestre | | Programado 3er.Trimestre | | Programado 4to.Trimestre | | Total Acumulado | % Ponderado |
| | | Unidades | % Ponderado | | |
| 30.000,0 | 0,5% | - | 1,0% | 10.000,0 | 0,2% | 20.000,0 | 0,3% | - | - | 30.000,0 | 0,5% |
| 50.000,0 | 2,5% | 20.000,0 | 1,0% | 10.000,0 | 0,5% | 10.000,0 | 0,5% | 10.000,0 | 0,5% | 50.000,0 | 2,5% |
| 12.000,0 | 2,4% | - | - | - | - | - | - | 12.000,0 | 2,4% | 12.000,0 | 2,4% |
| - | 2,4% | - | 1,0% | - | 1,0% | - | 0,2% | - | 0,2% | - | 2,4% |
| - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60,0 | 1,5% | 40,0 | 1,0% | 20,0 | 0,5% | - | - | - | - | 60,0 | 1,5% |
| 90,0 | 0,9% | - | - | 50,0 | 0,5% | 20,0 | 0,2% | 20,0 | 0,2% | 90,0 | 0,9% |
| - | 2,9% | - | - | - | 0,6% | - | 2,3% | - | - | - | 2,9% |
| 10,0 | 1,0% | - | - | - | - | 10,0 | 1,0% | - | - | 10,0 | 1,0% |
| 3.000,0 | 1,9% | - | - | 1.000,0 | 0,6% | 2.000,0 | 1,3% | - | - | 3.000,0 | 1,9% |
| - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0,7% | - | 0,1% | - | 0,1% | - | 0,3% | - | 0,1% | - | 0,7% |
| - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500,0 | 0,7% | 100,0 | 0,1% | 100,0 | 0,1% | 200,0 | 0,3% | 100,0 | 0,1% | 500,0 | 0,7% |
| - | 5,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500,0 | 5,0% | 25,0 | 0,2% | 50,0 | 0,5% | 200,0 | 2,0% | 225,0 | 2,3% | 500,0 | 5,0% |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 16,99% | - | 2,39% | - | 2,93% | - | 5,57% | - | 5,49% | - | 16,99% |

| PROGRAMACION AÑO 2024 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| META ANUAL | PONDERACION | TRIMESTRE 1 | | TRIMESTRE 2 | | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | |
| | | UNIDADES | PONDERACION | UNIDADES | PONDERACION | UNIDADES | PONDERACION | UNIDADES | PONDERACION |
| 500,00 | 5,00 | 25,00 | 0,250 | 50,00 | 0,500 | 200,00 | 2,000 | 225,00 | 2,250 |

2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Programación Anual



La información registrada en la Fase de Programación será la base para el cumplimiento de la Fase de Seguimiento.

| COMPONENTE MARCO LOGICO | PRODUCTO | META TOTAL | PONDERACION | PROGRAMACION AÑO 2024 | |
|--|---|------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | | META ANUAL | PONDERACION |
| C1: RESERVA Y DESARROLLO DEPORTIVO, PARA LOS POSIBLES TALENTOS CON MIRAS AL ALTO RENDIMIENTO | % de planes de preparación y participación en competencias de reserva deportiva | 100,00 | 20,00 | 25,00 | 5,00 |
| C2: PLAN DE ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIAS PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL CICLO OLIMPICO, PARALIMPICO, SORDOLIMPICO Y PROGRAMA MUNDIAL | % de planes de entrenamiento integral y competencia | 100,00 | 30,00 | 25,00 | 7,50 |
| C3: DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPORTISTA | % de Atletas atendidos por los profesionales de ciencias aplicadas | 100,00 | 15,00 | 25,00 | 3,75 |
| C4: EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO | % de seguimientos y acompañamientos metodológicos | 100,00 | 15,00 | 22,22 | 3,33 |
| C5: ESTÍMULOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO | % Atletas que reciben el incentivo deportivo | 100,00 | 20,00 | 25,00 | 5,00 |
| | | 100,00 | | 24,58 | |

Secretaría Nacional de Planificación





3. Seguimiento de Metas Físicas

3. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS

Seguimiento Primer Trimestre 2024

El proceso de **seguimiento correspondiente al Primer Trimestre de 2024** se realizará sobre la base de la programación realizada por las Entidades; en este sentido, las entidades realizarán el reporte del avance físico de estudios, programas y proyectos de inversión con corte al **31 de marzo de 2024**.

| TRIMESTRE 1 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|---------|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | | | | | | | | | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | | |

Para el cumplimiento de la Fase de Seguimiento, se tomará como base la información registrada en la Fase de Programación.

3. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS

Seguimiento Primer Trimestre 2024

El cálculo del avance físico de los estudios, programas y proyectos de inversión se efectúa contrastando el reporte de la información de los resultados físicos alcanzados durante el periodo, con relación a la programación anual realizada, teniendo como base el documento de proyecto que cuenta con dictamen de prioridad o su actualización de la prioridad.



Link para ingreso al Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional:

<https://www.planificacion.gob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-inversion-publica/>

Secretaría Nacional de Planificación



3. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS

- Una vez ingresada la información del seguimiento del primer trimestre en TODOS LOS INDICADORES, se regresará a la pantalla principal en la cual se podrá verificar los valores actualizados de: Ejecución primer trimestre, Avance 2024 y Avance total acumulado.

| EJECUCION PROYECTO | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| Ejecución Primer Trimestre | Ejecución Segundo Trimestre | Ejecución Tercer Trimestre | Ejecución Cuarto Trimestre | |
| AVANCE FISICO | | | | |
| 5.0 % * | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | | |
| 77.78 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Avance 2024 | 5.0 % | | | |
| Avance Total Acumulado | 42.79 % | | | |
| Estado | EN EJECUCION ▾ -- Seleccione -- EN EJECUCION NO INICIA PARALIZADO FINALIZADO | | | |

Recuerde: Se deberá verificar el ESTADO del proyecto y actualizarlo en caso de ser necesario.

Secretaría Nacional de Planificación



3. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS

Para finalizar, ingrese los **LOGROS y NUDOS CRÍTICOS** del proyecto correspondientes al segundo trimestre.

| LOGROS Y NUDOS CRÍTICOS |
|--|
| Primer Trimestre Ingrese aquí los logros y nudos del trimestre |
| Segundo Trimestre |
| Tercer Trimestre |
| Cuarto Trimestre |
| <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> |

Recuerde: Los LOGROS y NUDOS CRÍTICOS deben ser relevantes y justificar el avance o problemas del proyecto, puesto que dicha información se presenta a las **autoridades nacionales**. No olvide grabar dando clic en GUARDAR

Secretaría Nacional de Planificación



3. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS

Para finalizar, ingrese los **LOGROS y NUDOS CRÍTICOS** del proyecto correspondientes al primer trimestre.

Recuerde:

Los LOGROS y NUDOS CRÍTICOS deben ser relevantes y justificar el avance o problemas del proyecto, puesto que dicha información se presenta a las **autoridades nacionales**.

Por tanto, se debe ingresar información clara, sin acrónimos o siglas, que sea comprensible para externos.



Se recomienda no ingresar más de 250 caracteres !

| LOGROS Y NUDOS CRÍTICOS |
|---|
| Primer Trimestre L: 1. Implementación de un Centro Violeta en Lago Agrio, Latacunga y Esmeraldas, Tiempservicios de Centros Violeta, 2. Falta de disponibilidad de inmuebles para implementación de Centros Violeta |
| Segundo Trimestre |
| Tercer Trimestre |
| Cuarto Trimestre |
| <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> |

Los datos del Proyecto 113150000.0000.381389, se han guardado correctamente

Secretaría Nacional de Planificación





4. Recomendaciones Generales

4. Recomendaciones Generales

LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024

- El registro de la información de la Fase de Programación y Seguimiento (Primer Trimestre 2024) en el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP (Gasto No Permanente) se desarrollará del **05 al 15 de abril** de 2024.
- Las unidades de planificación en conjunto con las unidades de seguimiento de las entidades, son responsables de validar la información generada por la unidad ejecutora del proyecto; así como también la calidad de la información registrada en el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP.
- Las Universidades y Escuelas Politécnicas deberán contar con el **documento del proyecto** y su **dictamen de prioridad**, cargados en el módulo de inversión del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, acorde a lo dispuesto en el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el artículo 47 de su reglamento.
- Procure no ingresar la información los últimos días para evitar contratiempos y saturación del sistema.
- Procure cargar la información de la programación y seguimiento 2024 en función de los lineamientos publicados. Cualquier requerimiento para modificar posteriormente la programación de un proyecto únicamente estará motivado por una actualización en el Dictamen de Prioridad acorde al Art. 106 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La Secretaría Nacional de Planificación analizará la pertinencia del requerimiento.

Secretaría Nacional de Planificación



4. Recomendaciones Generales

LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024

- Toda la documentación relacionada al proceso de programación y seguimiento se encuentra publicada para su descarga a través del siguiente enlace: <http://www.planificacion.gob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-inversion-publica/>

| Seguimiento a la Inversión | |
|---|---|
| Metodología de Seguimiento a Proyectos |  |
| Lineamientos para actualización de Información Módulo Seguimiento - Gasto No Permanente |  |
| Lineamientos de Programación y Seguimiento Gasto No Permanente - 2022 |  |
| Lineamientos de Programación y Seguimiento Gasto No Permanente - 2023 |  |
| Cierre o baja de proyectos | |
| • Normativa para Cierre-Baja de Proyectos de Inversión |  |
| Lineamientos de Seguimiento GNP Primer trimestre 2024 | |
| • SNP-SNP-2024-0141-OF |  |
| • SNP-SNP-2024-0140-OF | |
| • Oficio Circular MEF-SNP-2024-001 | |
| • Lineamientos_pai_1_trim_2024 | |
| • Anexo 1 Cronograma capacitaciones seguimiento inversión | |
| • Manual de Usuario Módulo de Seguimiento Gasto No Permanente | |

Secretaría Nacional de Planificación



4. Recomendaciones Generales

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Recuerde que el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional (Gasto no Permanente) únicamente está disponible para navegadores: Internet Explorer versión 11, y Mozilla Firefox versión 91.8.



The screenshot shows the SIPeIP (Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública) interface. It features a navigation menu with three main options: 'Planificación', 'Inversión', and 'Seguimiento A Obras'. The 'Seguimiento a la Planificación Institucional' option is highlighted with a red box and includes a checkmark icon. Below the navigation menu, a system requirements banner states: 'Este Sistema solo es compatible con el navegador Firefox 91.8.0'. It provides instructions to download the Firefox installer based on the operating system (Windows x32, Windows x64, Linux, or Mac) and to download and review the installation manual.

En caso de no disponer del navegador Mozilla Firefox versión 91.8, en la parte lateral encontrará un Manual de Instalación.

Coordine con el área de TICs de su entidad para su instalación.

Secretaría Nacional de Planificación





Preguntas



Gracias



Secretaría Nacional
de Planificación
